

## Solicitud de apoyo - Concordar meta física

Antonio Toledo <atoledo@infom.gob.gt>

Lun 31/08/2020 10:17

**Para:** snip <snip@segeplan.gob.gt>

**CC:** jose leonel perez troccoli <chepogua@hotmail.com>; Mario Roberto López Pérez <mario.lopez@segeplan.gob.gt>; hugo.castellanos@segeplan.gob.gt <hugo.castellanos@segeplan.gob.gt>

 1 archivos adjuntos (299 KB)

Meta fisica PANIMACOC.pdf;

Guatemala, 31 de agosto de 2020

Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-

**Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-**

Reciba un cordial saludo y a la vez, solicito de su apoyo para que la meta física registrada en el SNIP, del proyecto: “CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO. SNIP 187496”, pueda concordar con la meta física ejecutada del Sistema Informático de Gestión –SIGES-, aclarando que, la meta física del SNIP es la correcta.

Para evidenciar lo anterior, se adjunta un archivo en formato PDF, el cual contiene la Boleta de Ejecución del Proyecto (fecha de emisión: 27/08/2020), del SNIP y el REPORTE R00818630.rpt (fecha de emisión: 27/08/2020), del SIGES. Las cantidades resaltadas en color amarillo, corresponden a valores acumulados en el presente ejercicio fiscal.

De antemano agradezco su apoyo y consideración.

Atentamente,

Ing. Antonio Toledo

Programa de Desarrollo y Ejecución.

c.c.

Ing. José Leonel Pérez Tróccoli

**Director Ejecutivo**

**Programa de Desarrollo y Ejecución**

**INFOM-UNEPAR**



0187496 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/03/2020

Fecha de finalización 31/12/2020

Descripción de la fase a financiar:


Rotulo, Línea de impulsión y distribución, tanque elevado, conexiones prediales y sumideros.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: 14.82% al: 06/08/20

Información de recursos financieros:

Table with 5 columns: Fuente de Financiamiento, Solicitado 2020, Asignado Actualizado, Desembolsado MINFIN, Ejecutado al: 06-AUG-20. Rows include TOTAL, Recursos internos (Gobierno central, Comunidad, Aporte municipal, Otros aportes), and Otras fuentes.

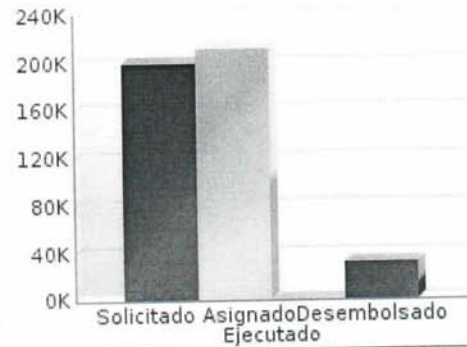

Seguimiento Físico

Avance fisico: 48.06% al: 30/07/20

Información de rubros:

Table with 5 columns: Rubro, Unidad de medida, Reprogramado, Ejecutado. Rows include Conexiones prediales, Línea de conducción, Línea de distribución, Tanque de distribución, and Obras y trabajos complementarios.

Handwritten notes: of. 022-2020, 3613, 25 mdep.

Seguimiento Administrativo

al:

Problema(s):

Accion(es):

Responsable:

Seguimiento Cualitativo

al:

Problema(s):

Accion(es):

Información complementaria:

Handwritten notes: VERPE 84-2020

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión  
 UNIDAD EJECUTORA = 301, UNIDAD EJECUTORA = 301  
 Expresado en Quetzales

Ejercicio 2020

PG SP PY ACT OBR	SNIP	Descripción	Estado Segeplan	UBG	Unidad de Medida	Metas Físicas			Presupuesto Financiero			
						Inicial	Vigente Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
Entidad: 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-												
301	FONDO NACIONAL UNEPAR											
0002	COMPRAS INFOM - UNEPAR											
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
00	SIN SUBPROGRAMA											
001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO											
000	002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS										
131996		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	APROBADO	1713	Metro	0.00	6.00	0.00	0.00	4,937,993.00	39,226.30	0.79
		BETHEL, LAS CRUCES, PETEN								4,937,993.00	39,226.30	0.79
133272		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	APROBADO	0904	Metro	0.00	659.00	0.00	0.00	4,937,993.00	39,226.30	0.79
		ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO								4,937,993.00	39,226.30	0.79
138102		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	APROBADO	1326	Metro	0.00	996.00	0.00	0.00	4,937,993.00	39,226.30	0.79
		ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ								517,728.00	0.00	0.00
150098		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	APROBADO	1406	Metro	0.00	10,087.00	0.00	0.00	50,548.00	0.00	0.00
		CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO								135,069.00	7,929.20	5.87
171648		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	APROBADO	1210	Metro	0.00	3,321.00	0.00	0.00	293,214.00	0.00	0.00
		ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA										
171885		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	APROBADO	1013	Metro	0.00	5,728.00	0.00	0.00	666,612.00	0.00	0.00
		CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO										
185559		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE	APROBADO	1325	Metro	0.00	975.00	0.00	0.00	1,087,265.00	0.00	0.00
		IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO										
185827		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE	SECTORAPROBADO	1010	Metro	0.00	4,272.00	0.00	0.00	884,000.00	0.00	0.00
		LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO										
186007		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE	APROBADO	0401	Metro	0.00	3,156.00	0.00	0.00	791,622.00	0.00	0.00
		CASERIO YERBABUENA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO										
187496		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	APROBADO	0406	Metro	0.00	3,409.00	0.00	0.00	211,169.00	31,297.10	14.82
		ALDEA PANIMACOC, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO										

Saldo a  
 el presupuesto  
 ejercicio fiscal  
 acumulado en
